

检测报告

检测类别: X 射线检测

委托单位: 江苏新凯晟机械设备有限公司

工件名称: 吸附筒 R26500

报告编号: RTBG240601-2299

报告日期: 2026-09-17

江苏诚安检验检测有限公司

报告说明

1. 本报告无检测、审核、签发人员签字和检测机构的核准证号、检验检测专用章无效。
2. 委托单位对检测结论如有异议，应在收到检测报告之日起 15 日内，以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
3. 未经本公司书面同意，检测报告不得用于商业宣传，不得部分复制检测报告。
4. 委托检测仅对被检样品负责，本报告中的检测结果均在检测状态下得出。

公司地址：泰州市东润第一城商业 B 楼 401 室

公司网址：<http://www.tzchengan.cn>

电话：0523-86879718

传真：0523-86879708

邮政编码：225300

邮箱：xjsca@163.com

微信



6879718



射线检测报告

第 1 页, 共 3 页

JSCA-BG-007-1/2

委托单位		江苏新凯晟机械设备有限公司		报告编号		RTBG240601-2299					
	工件名称	吸附筒		工件编号	R26500		工件材质	S30408			
	坡口型式	I		焊接方法	SMAW/SAW		表面状态	打磨			
	热处理状态	/		检测时机	目视检查合格后		检测部位	焊接接头			
器具 参数	射线装置	X 射线机		设备型号	XXG-2505T XXH-3005C		设备编号	N169 N040			
	焦点尺寸 (mm)	2.0×2.0mm 1.0×2.3mm		胶片牌号	富明威		胶片类别	C5			
	像质计种类	线型像质计		像质计型号	10 FE JB		像质计放置	源侧			
	增感方式	铅箔增感屏		增感屏厚度	前、后 0.03mm		冲洗方式	手工冲洗			
	显影条件	20±2℃, 5~8min		透照技术	单片透照		技术等级	AB 级			
检测 条件 及 工 艺 参 数	焊接接头 (部件) 编号		A1		B1/B2						
	工件规格 (mm)		Φ1700×10		Φ1700×10						
	透照方式		外-单壁透照		中心内透						
	焦距 (mm)		700		850						
	能量 (kV)		160		160						
	管电流(mA)/活度(Ci)		5		5						
	曝光时间(min)		3		6						
	要求像质计灵敏度		13		13						
	焊接接头 (部件) 长度 (mm)		1800		5400						
	要求检测比例 (%)		≥20		≥20						
	一次透照长度 (mm)		300		297						
	实际检测比例 (%)		33		27						
合格级别 (级)		III		III							
执行标准		NB/T47013.2-2015		验证标识		/		原始记录编号		RTYS240601-2299-01~02	
合格片 数	A 类接 头(张)	B 类接 头(张)	D 类接 头(张)	相交接 头(张)	共计 (张)	最终 评定 结果	I 级 (张)	II 级 (张)	III 级 (张)	IV 级 (张)	
	2	10	0	2	12		12	0	0	0	
缺陷及返修情况说明						检测结果					
1、本工件返修共计 0 处, 最高返修次数 0 次。 2、超标缺陷部位返修经复检合格。 3、返修部位缺陷情况见射线检测报告 (续表)。						1、本工件焊接接头 (部件) 质量射线检测评定结果为 合格。 2、检测位置及底片情况详见射线检测报告 (续表) 及射线检测位置示意图 (另附)。					
编制: 杨邦科 RTII						2026-09-17		江苏诚安检验检测有限公司 机构核准证号			

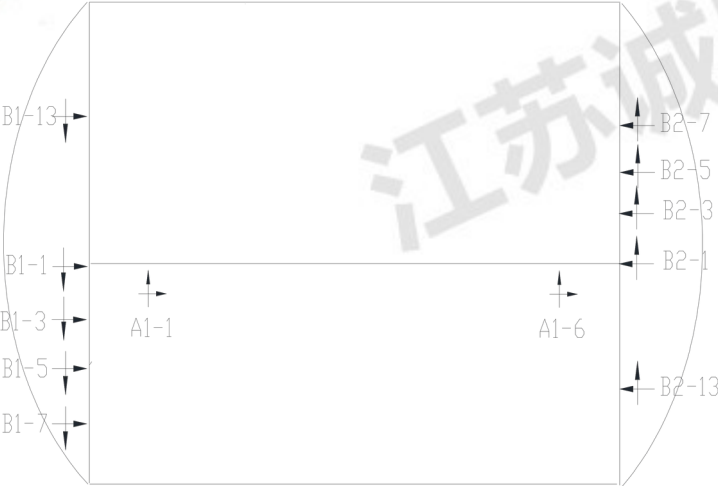


缺陷性质： C=裂纹， IF =未熔合， IP =未焊透， SF=条形缺陷， RF=圆形缺陷， IS=根部内凹， SU=根部咬边。									
编制： 杨邦科 RTII 日期： 2026-09-17					审核： 孙君正 日期： 2026-09-17				



检测部位示意图

第 3 页，共 3 页

委托单位	江苏新凯晟机械设备有限公司	报告编号	RTBG240601-2299
			



® Jiangsu Cheng'an Inspection
and Testing Co. LTD

江苏诚安
